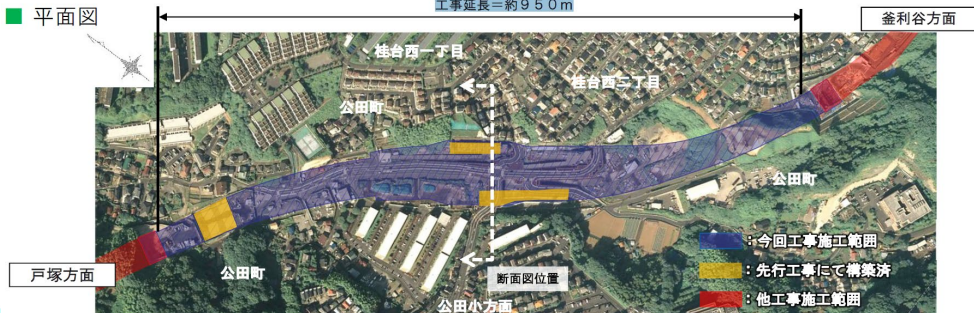

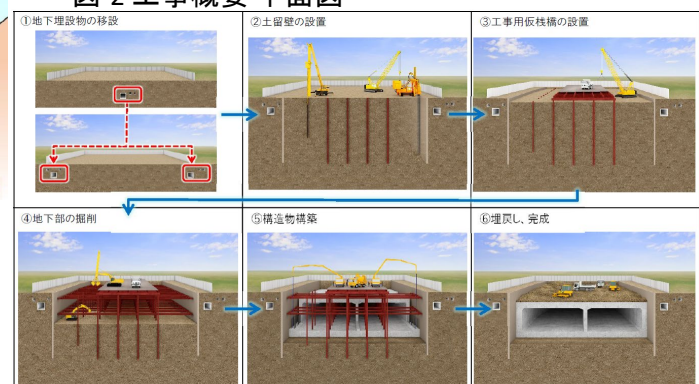
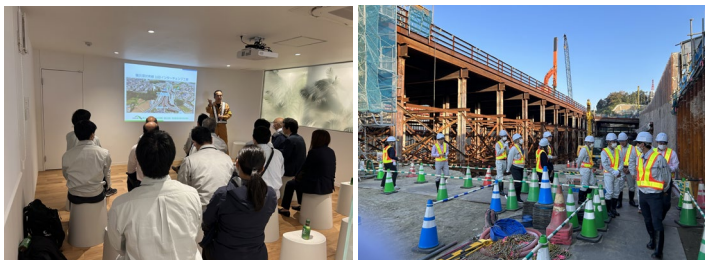


令和5年度第4回Premium現場見学会報告書			整理番号	
件名	横浜環状南線 公田 ^{くでん} インターチェンジ工事 現場見学会			
概要及び目的				
公田インターチェンジ工事は、横浜環状南線の一部で、釜利谷ジャンクションと栄インター・ジャンクション(仮称)を結ぶ区間の中間に設置するインターチェンジを建設する工事です。 本工事の契約は、技術提案・交渉方式の内、技術協力・施工タイプ〔ECI(Early Contractor Involvement)方式〕で行われ、住宅に近接した環境で、生活道路やライフラインの切り回し、工事用車両の通行、作業時の騒音・振動対策など、様々な課題に対応し施工しています。 今回は、そういった現場の施工状況を見学しました。 工事概要： 函渠工 約900m				
見学先詳細				
工事名	横浜環状南線 公田インターチェンジ工事			
事業主体	東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所 桂公田工事区			
発注者	東日本高速道路(株) 関東支社			
施工者	(株)大林組・東亜建設工業(株)・(株)大本組 特定建設工事共同企業体			
見学日	令和5年10月27日	参加者	15名	
備考	よこかんみなみ<トップページ> 圏央道-横浜環状南線の現在の進ちょく状況をお知らせします https://www.yokokan-minami.com/site/ フォトギャラリー(公田・朝日平和台) ※よこかんみなみ<各地区トピックス>より https://www.yokokan-minami.com/site/topics/4/3.html			
 図-1 位置図  図-2 工事概要 平面図  図-3 工事概要 断面図(図-2 白破線位置)  図-4 標準的な施工手順  写真-1 現場見学状況  写真-2 集合写真				
